Приложение № 2

График производства работ
по благоустройству территории в границах и за границами отведенного земельного участка
жилого дома № 32 (по ГП)
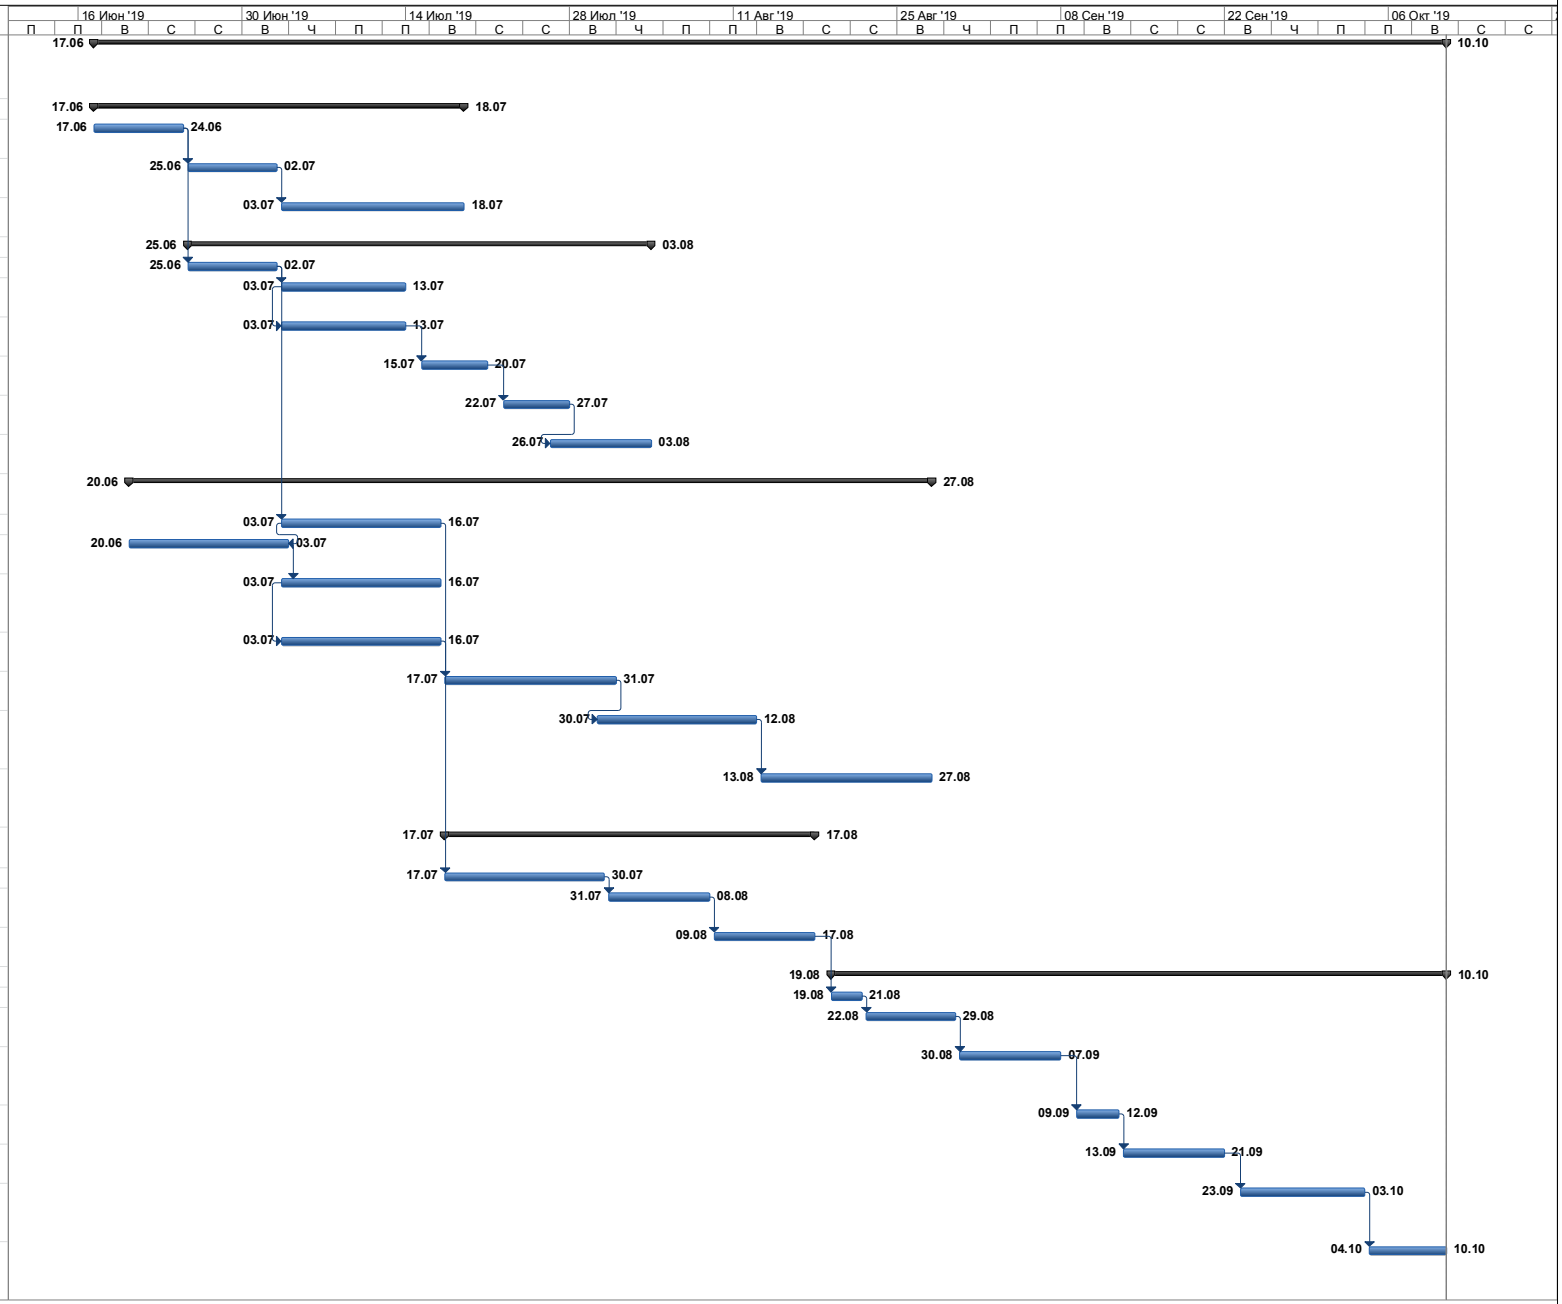
Название задачи	Начало	Окончание
Комплекс работ по благоустройству территории жилого дома № 32 (по ГП)	**Пн 17.06.19**	**Чт 10.10.19**
Отмостка	**Пн 17.06.19**	**Чт 18.07.19**
Планировка участка в границах отмостки, уплотнение	Пн 17.06.19	Пн 24.06.19
Устройство основания из щебня фр.40-70 марки 600 F25 t=150мм	Вт 25.06.19	Вт 02.07.19
Устройство монолитной отмостки из бетона В15 t=150…85мм	Ср 03.07.19	Чт 18.07.19
Тротуары	**Вт 25.06.19**	**Сб 03.08.19**
Разработка грунта, уплотнение	Вт 25.06.19	Вт 02.07.19
Устройство бетонной подушки из бетона В10	Ср 03.07.19	Сб 13.07.19
Установка бортового камня БР 100.20.8	Ср 03.07.19	Сб 13.07.19
Устройство основания из щебня фр.40-70 марки 600 F25 t=100мм	Пн 15.07.19	Сб 20.07.19
Устройство основания из щебня фр.20-40 марки 600 F25 t=50мм	Пн 22.07.19	Сб 27.07.19
Укладка мелкозернистого асфальтобетона типа Б t=50мм	Пт 26.07.19	Сб 03.08.19
Проезды и площадки для стоянки автомобилей	**Чт 20.06.19**	**Вт 27.08.19**
Разработка грунта, уплотнение	Ср 03.07.19	Вт 16.07.19
Устройство песчаного основания t=200мм	Чт 20.06.19	Ср 03.07.19
Устройство бетонной подушки из бетона В15 для установки бортового камня	Ср 03.07.19	Вт 16.07.19
Установка бортового камня БР 100.30.15	Ср 03.07.19	Вт 16.07.19
Устройство основания из щебня фр.40-70 марки 600 F25 t=150мм	Ср 17.07.19	Ср 31.07.19
Устройство основания из щебня фр.20-40 марки 600 F25 с розливом битумной эмульсии t=50мм	Вт 30.07.19	Пн 12.08.19
Укладка мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки М-I t=70мм	Вт 13.08.19	Вт 27.08.19
Дорожки и площадки из каменистых высевок	**Ср 17.07.19**	**Сб 17.08.19**
Разработка грунта, уплотнение	Ср 17.07.19	Вт 30.07.19
Устройство антисептированных брусков, досок	Ср 31.07.19	Чт 08.08.19
Устройство каменистых высевок из гравия фр.5-8 t=100мм	Пт 09.08.19	Сб 17.08.19
Проезды за границами участка	**Пн 19.08.19**	**Чт 10.10.19**
Разработка грунта, уплотнение	Пн 19.08.19	Ср 21.08.19
Устройство песчаного основания t=200мм	Чт 22.08.19	Чт 29.08.19
Устройство бетонной подушки из бетона В15 для установки бортового камня	Пт 30.08.19	Сб 07.09.19
Установка бортового камня БР 100.30.15	Пн 09.09.19	Чт 12.09.19
Устройство основания из щебня фр.40-70 марки 600 F25 t=150мм	Пт 13.09.19	Сб 21.09.19
Устройство основания из щебня фр.20-40 марки 600 F25 с розливом битумной эмульсии t=50мм	Пн 23.09.19	Чт 03.10.19
Укладка мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки М-I t=70мм	Пт 04.10.19	Чт 10.10.19
