График производства работ
по благоустройству территории жилого дома № 15 (стр.)
по ул. Титова
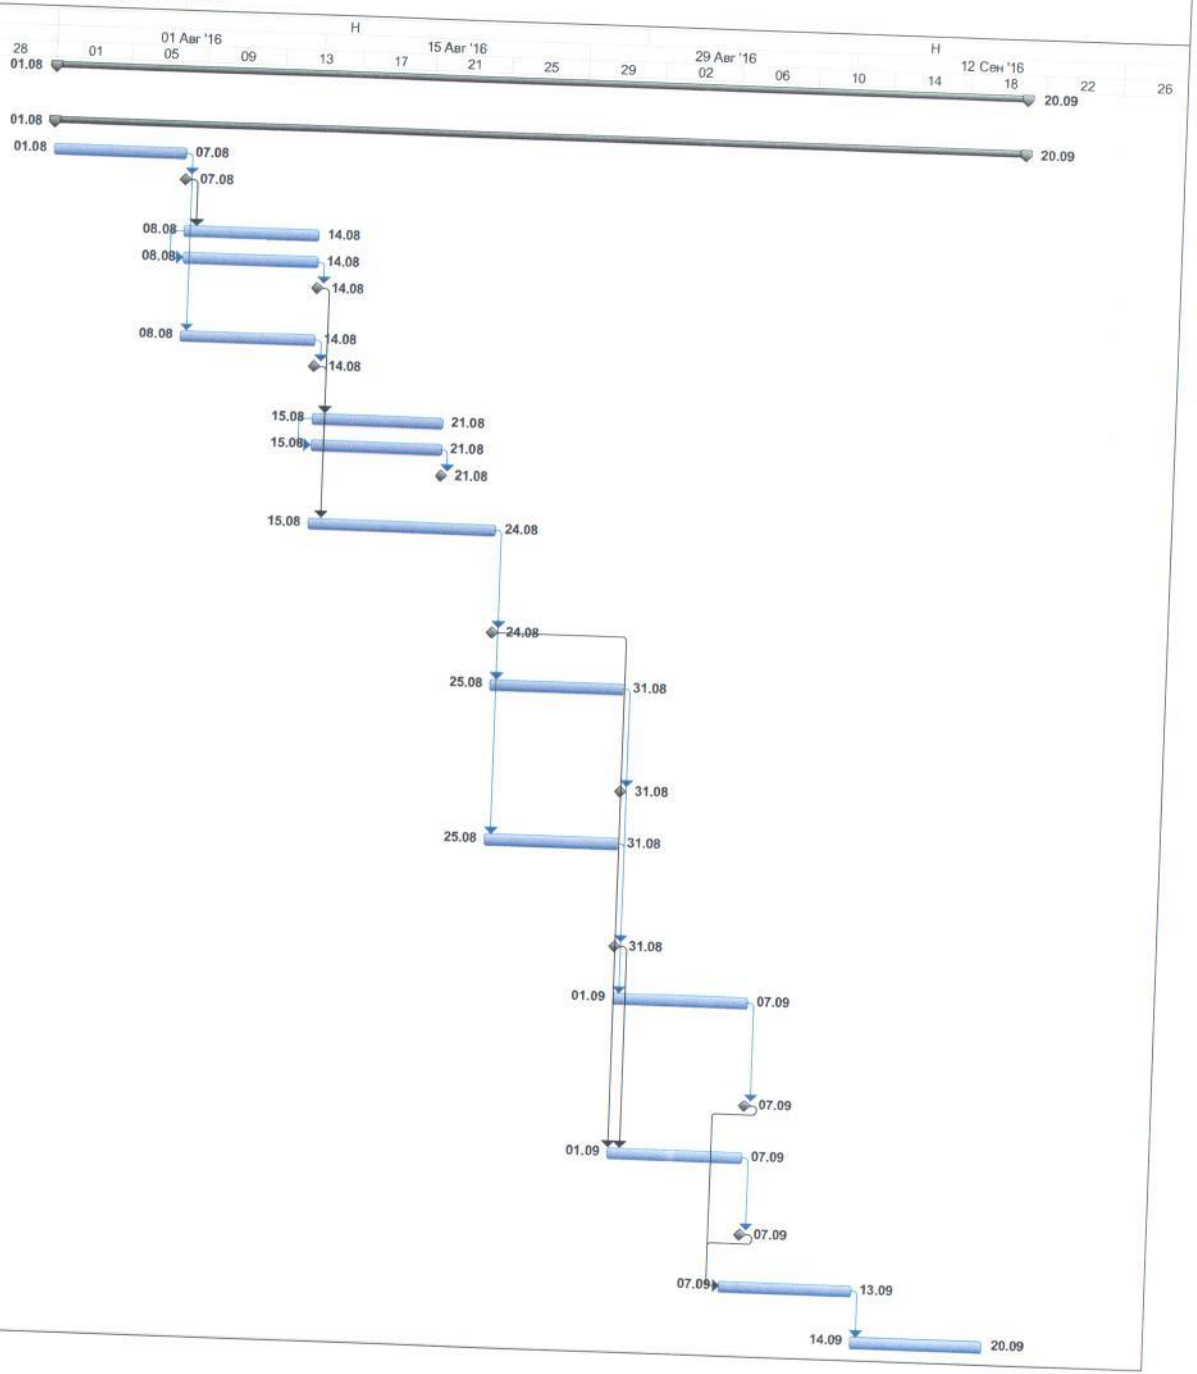
Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
Благоустройство территории жилого дома № 15 (стр.)	**51 дней**	**Пн 01.08.16**	**Вт 20.09.16**
блок-секции 1-7	**51 дней**	**Пн 01.08.16**	**Вт 20.09.16**
Земляные работы (1-7 б/с) подъезды	7 дней	Пн 01.08.16	Вс 07.08.16
Предъявление планировки поверхности земляного полотна техническому надзору	*0 дней*	*Вс 07.08.16*	*Вс 07.08.16*
Установка бортового камня	7 дней	Пн 08.08.16	Вс 14.08.16
Устройство щебеночного основания	7 дней	Пн 08.08.16	Вс 14.08.16
Предъявление щебеночного основания техническому надзору	*0 дней*	*Вс 14.08.16*	*Вс 14.08.16*
Земляные работы (7-1 б/с)	7 дней	Пн 08.08.16	Вс 14.08.16
Предъявление планировки поверхности земляного полотна техническому надзору	*0 дней*	*Вс 14.08.16*	*Вс 14.08.16*
Установка бортового камня	7 дней	Пн 15.08.16	Вс 21.08.16
Устройство щебеночного основания	7 дней	Пн 15.08.16	Вс 21.08.16
Предъявление щебеночного основания техническому надзору	*0 дней*	*Вс 21.08.16*	*Вс 21.08.16*
Устройство покрытия из асфальтобетона проездов, стоянок (второй слой) 1-7 б/с - подъезды * данные работы выполняются в зависимости от погодных условий	10 дней	Пн 15.08.16	Ср 24.08.16
Предъявление асфальтового покрытия техническому надзору	*0 дней*	*Ср 24.08.16*	*Ср 24.08.16*
Устройство покрытия из асфальтобетона проездов, стоянок (второй слой) (7-1 б/с) * данные работы выполняются в зависимости от погодных условий	7 дней	Чт 25.08.16	Ср 31.08.16
Предъявление асфальтового покрытия техническому надзору	*0 дней*	*Ср 31.08.16*	*Ср 31.08.16*
Устройство покрытия из асфальтобетона проездов, стоянок (второй слой) (1-7 б/с) * данные работы выполняются в зависимости от погодных условий	7 дней	Чт 25.08.16	Ср 31.08.16
Предъявление асфальтового покрытия техническому надзору	*0 дней*	*Ср 31.08.16*	*Ср 31.08.16*
Устройство покрытия из асфальтобетона проездов, стоянок (второй слой) (7-1 б/с) * данные работы выполняются в зависимости от погодных условий подъезды	7 дней	Чт 01.09.16	Ср 07.09.16
Предъявление асфальтового покрытия техническому надзору	*0 дней*	*Ср 07.09.16*	*Ср 07.09.16*
Устройство покрытия из асфальтобетона проездов, стоянок (второй слой) * данные работы выполняются в зависимости от погодных условий	7 дней	Чт 01.09.16	Ср 07.09.16
Предъявление асфальтового покрытия техническому надзору	*0 дней*	*Ср 07.09.16*	*Ср 07.09.16*
Устройство дорожек и площадок из каменистых высевок	7 дней	Ср 07.09.16	Вт 13.09.16
Устройство водоотводных сооружений	7 дней	Ср 14.09.16	Вт 20.09.16
