График производства работ
по гидроизоляции кровли на объекте строительства - многоквартирный жилой дом № 25 (по ГП)
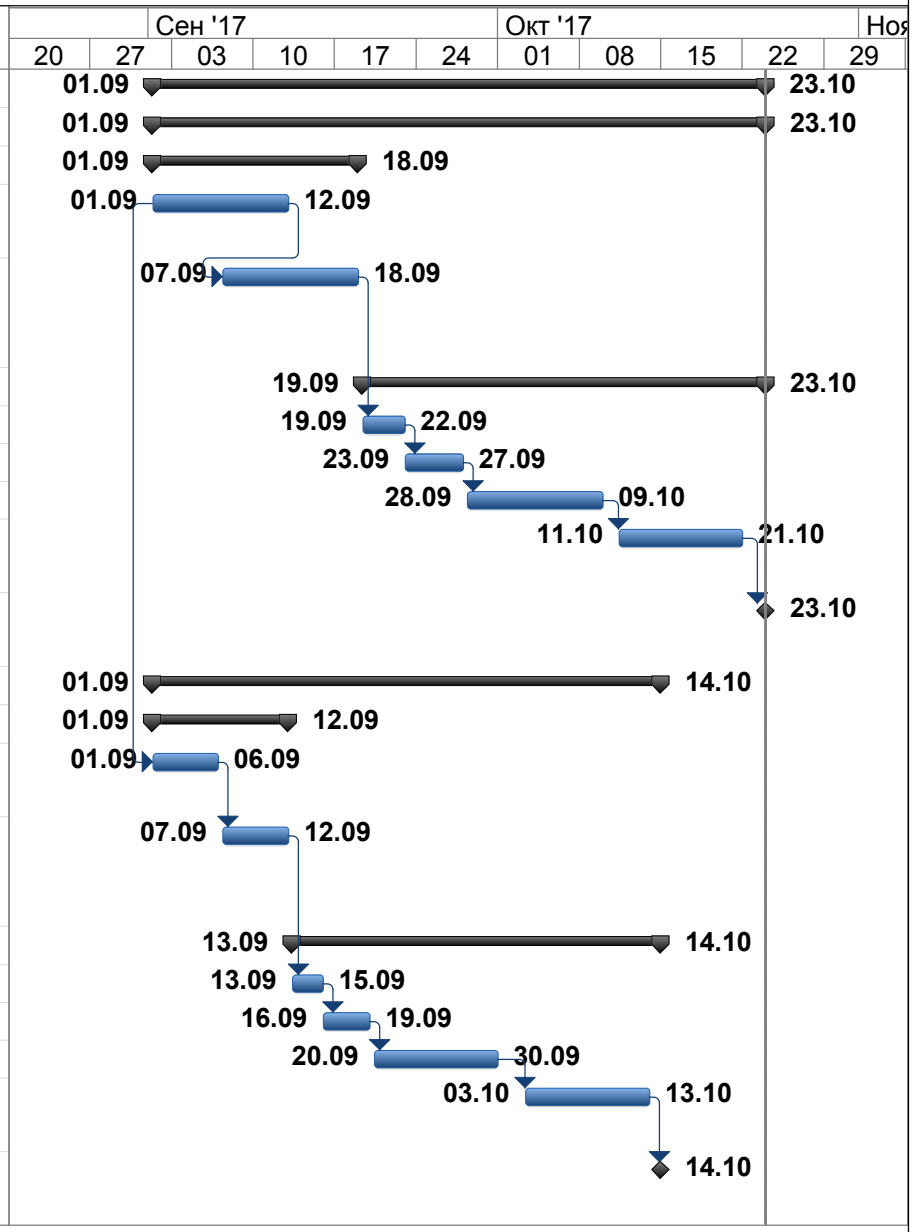
Название задачи	Начало	Окончание
Гидроизоляция кровли	**Пт 01.09.17**	**Пн 23.10.17**
Блок-секции 1-4	**Пт 01.09.17**	**Пн 23.10.17**
Подготовительные работы	**Пт 01.09.17**	**Пн 18.09.17**
Замоноличивание щелей и стыков цементно-песчанным раствором	Пт 01.09.17	Вт 12.09.17
Выполнение бортиков в местах примыкания к вертикальным поверхностям, местам пропуска труб	Чт 07.09.17	Пн 18.09.17
Нанесение основного кровельного ковра	**Вт 19.09.17**	**Пн 23.10.17**
Обеспылевание поверхности	Вт 19.09.17	Пт 22.09.17
Грунтование поверхности	Сб 23.09.17	Ср 27.09.17
Нанесение мастики "дельс-оптима"	Чт 28.09.17	Пн 09.10.17
Заделка швов герметиком с доп.слоем мастики "дельс-оптима"	Ср 11.10.17	Сб 21.10.17
Подписание акта освидетельствования скрытых работ	Пн 23.10.17	Пн 23.10.17
Блок-секции 5-7	**Пт 01.09.17**	**Сб 14.10.17**
Подготовительные работы	**Пт 01.09.17**	**Вт 12.09.17**
Замоноличивание щелей и стыков цементно-песчанным раствором	Пт 01.09.17	Ср 06.09.17
Выполнение бортиков в местах примыкания к вертикальным поверхностям, местам пропуска труб	Чт 07.09.17	Вт 12.09.17
Нанесение основного кровельного ковра	**Ср 13.09.17**	**Сб 14.10.17**
Обеспылевание поверхности	Ср 13.09.17	Пт 15.09.17
Грунтование поверхности	Сб 16.09.17	Вт 19.09.17
Нанесение мастики "дельс-оптима"	Ср 20.09.17	Сб 30.09.17
Заделка швов герметиком с доп.слоем мастики "дельс-оптима"	Вт 03.10.17	Пт 13.10.17
Подписание акта освидетельствования скрытых работ	Сб 14.10.17	Сб 14.10.17
