Ид.	Название задачи	Начало	Окончание	Подрядная организация
1	**КНС-7**	**Пт 25.03.16**	**Вт 09.08.16**	
2	**Подготовительные работы**	**Пт 25.03.16**	**Вт 26.04.16**	
6	**Устройство фундамента**	**Ср 27.04.16**	**Ср 20.07.16**	
7	**Земляные работы**	**Ср 27.04.16**	**Вс 01.05.16**	
8	**Поверхностный водоотлив**	Ср 27.04.16	Вс 03.07.16	
9	**Устройство плиты основания**	**Пн 02.05.16**	**Чт 19.05.16**	
10	Уплотнение основания щебнем	Пн 02.05.16	Пн 02.05.16	
11	Изготовление арматурных каркасов	Пн 02.05.16	Ср 04.05.16	
12	Установка опалубки, армирование	Сб 14.05.16	Сб 14.05.16	
13	Бетонирование	Ср 18.05.16	Ср 18.05.16	
14	Демонтаж опалубки	Чт 19.05.16	Чт 19.05.16	
15	Устройство гидроизоляции	Чт 19.05.16	Чт 19.05.16	
16	Обратная засыпка песком пазух котлована	Пт 01.07.16	Вс 03.07.16	
17	**Устройство плиты входа ПВ1**	**Пн 04.07.16**	**Ср 20.07.16**	
18	Изготовление арматурных каркасов	Пн 04.07.16	Ср 06.07.16	
19	Установка опалубки, армирование	Пн 18.07.16	Пн 18.07.16	
20	Бетонирование	Вт 19.07.16	Вт 19.07.16	
21	Демонтаж опалубки	Ср 20.07.16	Ср 20.07.16	
22	Устройство гидроизоляции	Ср 20.07.16	Ср 20.07.16	
23	**Возведение подземной части КНС**	**Чт 28.04.16**	**Чт 23.06.16**	**ООО "СНК"**
24	**Изготовление емкостей**	Чт 28.04.16	Вт 17.05.16	ООО "СНК"
25	**Установка емкостей**	**Пт 20.05.16**	**Чт 09.06.16**	**ООО "СНК"**
26	**Внутренняя обвязка емкостей**	**Пт 10.06.16**	**Чт 23.06.16**	**ООО "СНК"**
27	**Устройство антикоррозийного покрытия**	**Пт 24.06.16**	**Чт 30.06.16**	**ООО "СНК"**
28	**Устройство напорной канализации методом прокола**	**Пн 04.07.16**	**Ср 06.07.16**	**ООО "Строй ТЭКС НСК"**
29	**Устройство безнапорной канализации**	**Вт 19.07.16**	**Пт 29.07.16**	**ООО "Строй ТЭКС НСК"**
30	**Разработка грунта**	**Вт 19.07.16**	**Чт 21.07.16**	**ООО "Строй ТЭКС НСК"**
31	**Устройство основания (щебень)**	**Пт 22.07.16**	**Пт 22.07.16**	**ООО "Строй ТЭКС НСК"**
32	**Монтаж колодца**	**Сб 23.07.16**	**Сб 23.07.16**	**ООО "Строй ТЭКС НСК"**
33	**Монтаж трубопровода**	**Пн 25.07.16**	**Пн 25.07.16**	**ООО "Строй ТЭКС НСК"**
34	**Отсыпка песком**	**Вт 26.07.16**	**Вт 26.07.16**	**ООО "Строй ТЭКС НСК"**
35	**Предъявление работ Горводоканалу**	**Ср 27.07.16**	**Ср 27.07.16**	**ООО "Строй ТЭКС НСК"**
36	**Гидроизоляция колодца**	**Чт 28.07.16**	**Чт 28.07.16**	**ООО "Строй ТЭКС НСК"**
37	**Обратная засыпка**	**Пт 29.07.16**	**Пт 29.07.16**	**ООО "Строй ТЭКС НСК"**
38	**Устройство наземного павильона**	**Чт 21.07.16**	**Вт 09.08.16**	**ООО "СНК"**
39	**Установка наземного павильона**	**Чт 21.07.16**	**Пт 29.07.16**	**ООО "СНК"**
40	**Монтаж грузоподъемного оборудования**	**Пн 01.08.16**	**Вт 09.08.16**	**ООО "СНК"**
41	**Монтаж электрооборудования**	**Пн 01.08.16**	**Вт 09.08.16**	**ООО "СНК"**
42	**Монтаж отопления и вентиляции**	**Пн 01.08.16**	**Вт 09.08.16**	**ООО "СНК"**
43	**Проведение комплексной автоматизации**	**Пн 01.08.16**	**Вт 09.08.16**	**ООО "СНК"**
44	**Пуско-наладочные работы**	**Пн 01.08.16**	**Вт 09.08.16**	**ООО "СНК"**

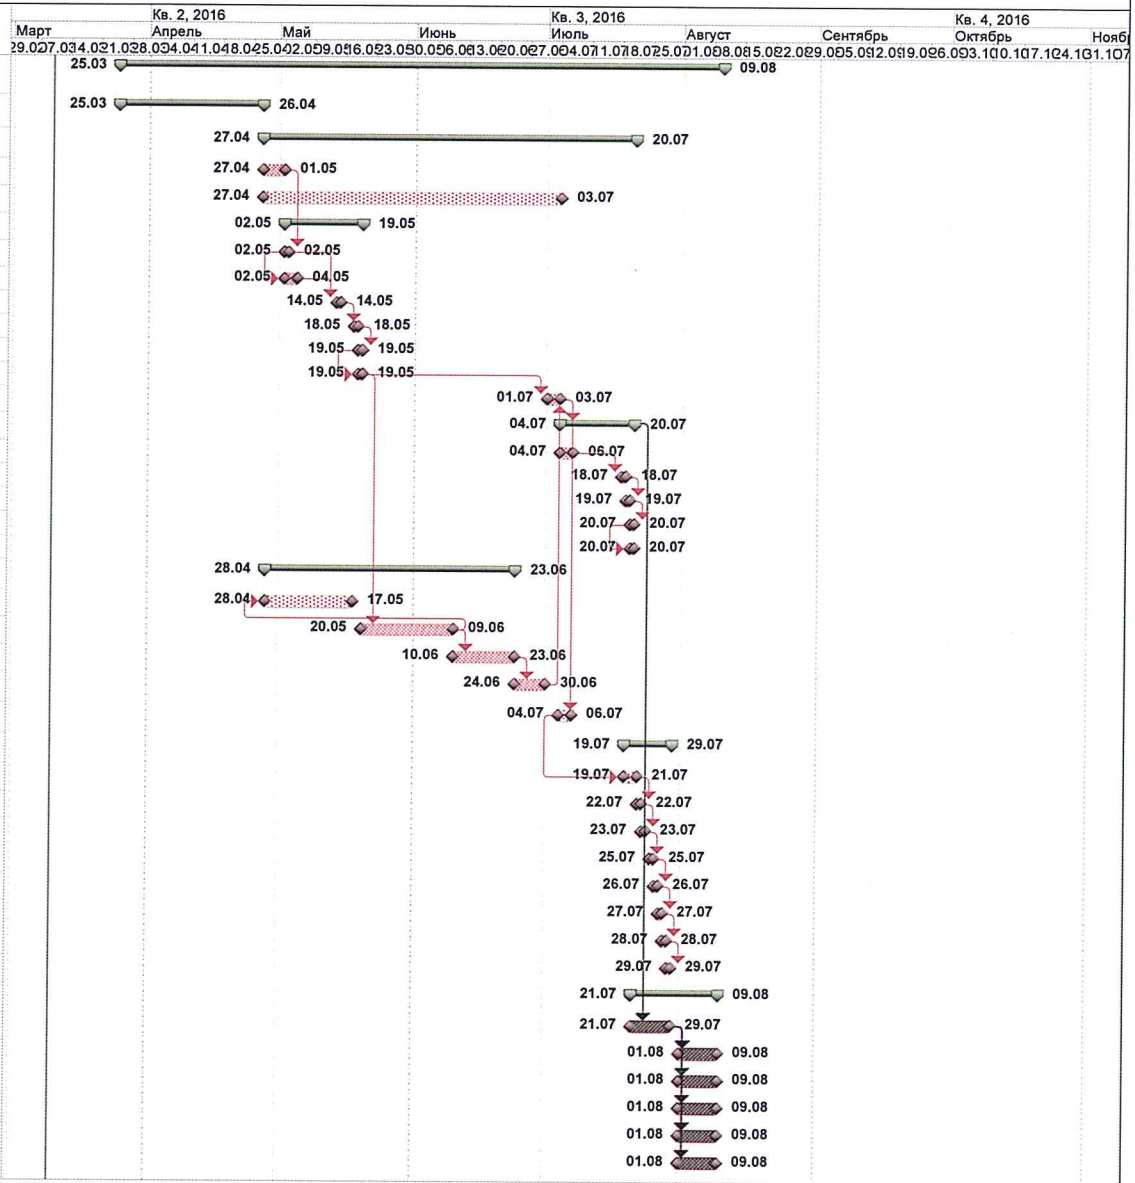

Приложение № 4
