График производства работ по монтажу внутренних систем отопления, горячего водоснабжения, водопровода и канализации на объекте строительства - многоквартирный жилой дом № 26 (по ГП)
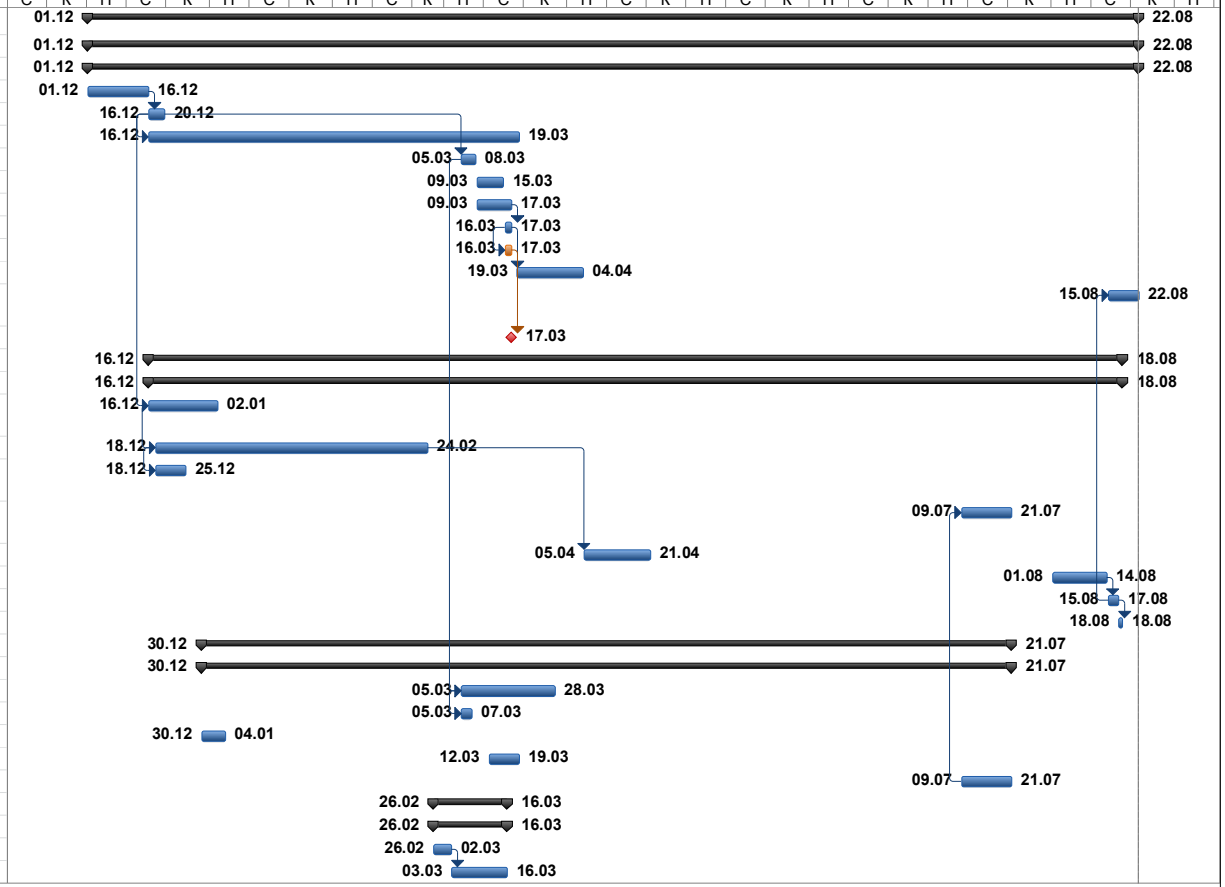
Название задачи	Начало	Окончание
Монтаж систем отпления, водоснабжения и канализации	**Пт 01.12.17**	**Ср 22.08.18**
Монтаж системы отопления	**Пт 01.12.17**	**Ср 22.08.18**
Блок-секции 1-2	**Пт 01.12.17**	**Ср 22.08.18**
Монтаж системы отпления в тех.подполье (магистраль)	Пт 01.12.17	Сб 16.12.17
Монтаж узлов отопления секций	Сб 16.12.17	Ср 20.12.17
Монтаж стояков и приборов отопления, гильз	Сб 16.12.17	Пн 19.03.18
Монтаж стояков и приборов отопления, гильз (16 ст., МОП)	Пн 05.03.18	Чт 08.03.18
Монтаж системы отпления в тех.подполье (розлив)	Пт 09.03.18	Чт 15.03.18
Грунтовка стояков, чеканка гильз в плитах перекрытия	Пт 09.03.18	Сб 17.03.18
Монтаж дренажной системы в тех.подполье, монтаж опор	Пт 16.03.18	Сб 17.03.18
Пневматические испытания	Пт 16.03.18	Сб 17.03.18
Грунтовка в тех.подполье, теплоизоляция	Пн 19.03.18	Ср 04.04.18
Установка индивидуальных счетчиков учета тепла, пожарных шлангов	Ср 15.08.18	Ср 22.08.18
Подача теплоносителя	Сб 17.03.18	Сб 17.03.18
Монтаж системы водоснабжения	**Сб 16.12.17**	**Сб 18.08.18**
Блок-секции 1-2	**Сб 16.12.17**	**Сб 18.08.18**
Монтаж системы водоснабжения по тех.подполью (магистраль)	Сб 16.12.17	Вт 02.01.18
Монтаж стояков ХВС, ГВС выше отм. 0.000	Пн 18.12.17	Сб 24.02.18
Монтаж системы водоснабжения по тех.подполью (подвязка стояков)	Пн 18.12.17	Пн 25.12.17
Монтаж горизонтальной разводки ХВС, ГВС из полипропиленовых труб	Пн 09.07.18	Сб 21.07.18
Грунтовка в тех.подполье, теплоизоляция	Чт 05.04.18	Сб 21.04.18
Установка санфаянса	Ср 01.08.18	Вт 14.08.18
Установка приборов учета, смесителей	Ср 15.08.18	Пт 17.08.18
Гидравлические испытания систем водоснабжения	Сб 18.08.18	Сб 18.08.18
Монтаж системы канализации	**Сб 30.12.17**	**Сб 21.07.18**
Блок-секции 1-2	**Сб 30.12.17**	**Сб 21.07.18**
Монтаж стояков	Пн 05.03.18	Ср 28.03.18
Установка противопожарных муфт	Пн 05.03.18	Ср 07.03.18
Монтаж фановых труб	Сб 30.12.17	Чт 04.01.18
Монтаж канализации по тех.подполью	Пн 12.03.18	Пн 19.03.18
Монтаж горизонтальной разводки	Пн 09.07.18	Сб 21.07.18
Монтаж ливневой канализации	**Пн 26.02.18**	**Пт 16.03.18**
Блок-секции 1-2	**Пн 26.02.18**	**Пт 16.03.18**
Монтаж стояков	Пн 26.02.18	Пт 02.03.18
Теплоизоляция	Сб 03.03.18	Пт 16.03.18
