

**График производства работ
по изготовлению и монтажу противопожарных
дверей и люков на объекте строительства - многоквартирный
многоэтажный дом № 62 (по ГП)**


Приложение № _____

Название задачи	Начало	Окончание	График работ													
			03.08	10.08	17.08	24.08	31.08	07.09	14.09	21.09	28.09	05.10	12.10	19.10	26.10	01.11
ЖИЛОЙ ДОМ № 62 (по ГП) - Изготовление и монтаж противопожарных дверей и люков	Пт 14.08.20	Вт 03.11.20														
Блок-секция 6	Пт 14.08.20	Ср 16.09.20														
Тех.этаж, кровля	Пт 14.08.20	Вт 08.09.20														
Выполнение замеров, изготовление, поставка	Пт 14.08.20	Чт 03.09.20														
Монтаж дверей и люков	Пт 04.09.20	Вс 06.09.20														
Выполнение герметизации проемов	Пн 07.09.20	Вт 08.09.20														
Подписание акта приеме-передачи выполненных работ	Вт 08.09.20	Вт 08.09.20														
Машинное помещение	Пт 14.08.20	Ср 16.09.20														
Выполнение замеров, изготовление, поставка	Пт 14.08.20	Чт 03.09.20														
Монтаж дверей	Вс 13.09.20	Пн 14.09.20														
Выполнение герметизации проемов	Вт 15.09.20	Вт 15.09.20														
Подписание акта приеме-передачи выполненных работ	Ср 16.09.20	Ср 16.09.20														
Блок-секция 5	Вт 25.08.20	Вс 27.09.20														
Тех.этаж, кровля	Вт 25.08.20	Сб 19.09.20														
Выполнение замеров, изготовление, поставка	Вт 25.08.20	Пн 14.09.20														
Монтаж дверей и люков	Вт 15.09.20	Чт 17.09.20														
Выполнение герметизации проемов	Пт 18.09.20	Сб 19.09.20														
Подписание акта приеме-передачи выполненных работ	Сб 19.09.20	Сб 19.09.20														
Машинное помещение	Вт 25.08.20	Вс 27.09.20														
Выполнение замеров, изготовление, поставка	Вт 25.08.20	Пн 14.09.20														
Монтаж дверей	Чт 24.09.20	Пт 25.09.20														
Выполнение герметизации проемов	Сб 26.09.20	Сб 26.09.20														
Подписание акта приеме-передачи выполненных работ	Вс 27.09.20	Вс 27.09.20														
Блок-секция 4	Вс 27.09.20	Пт 30.10.20														
Тех.этаж, кровля	Вс 27.09.20	Чт 22.10.20														
Выполнение замеров, изготовление, поставка	Вс 27.09.20	Сб 17.10.20														
Монтаж дверей и люков	Вс 18.10.20	Вт 20.10.20														
Выполнение герметизации проемов	Ср 21.10.20	Чт 22.10.20														
Подписание акта приеме-передачи выполненных работ	Чт 22.10.20	Чт 22.10.20														

Начальник ПТО
М.А. Запылихин

**График производства работ
по изготовлению и монтажу противопожарных
дверей и люков на объекте строительства - многоквартирный
многоэтажный дом № 62 (по ГП)**

Приложение № _____

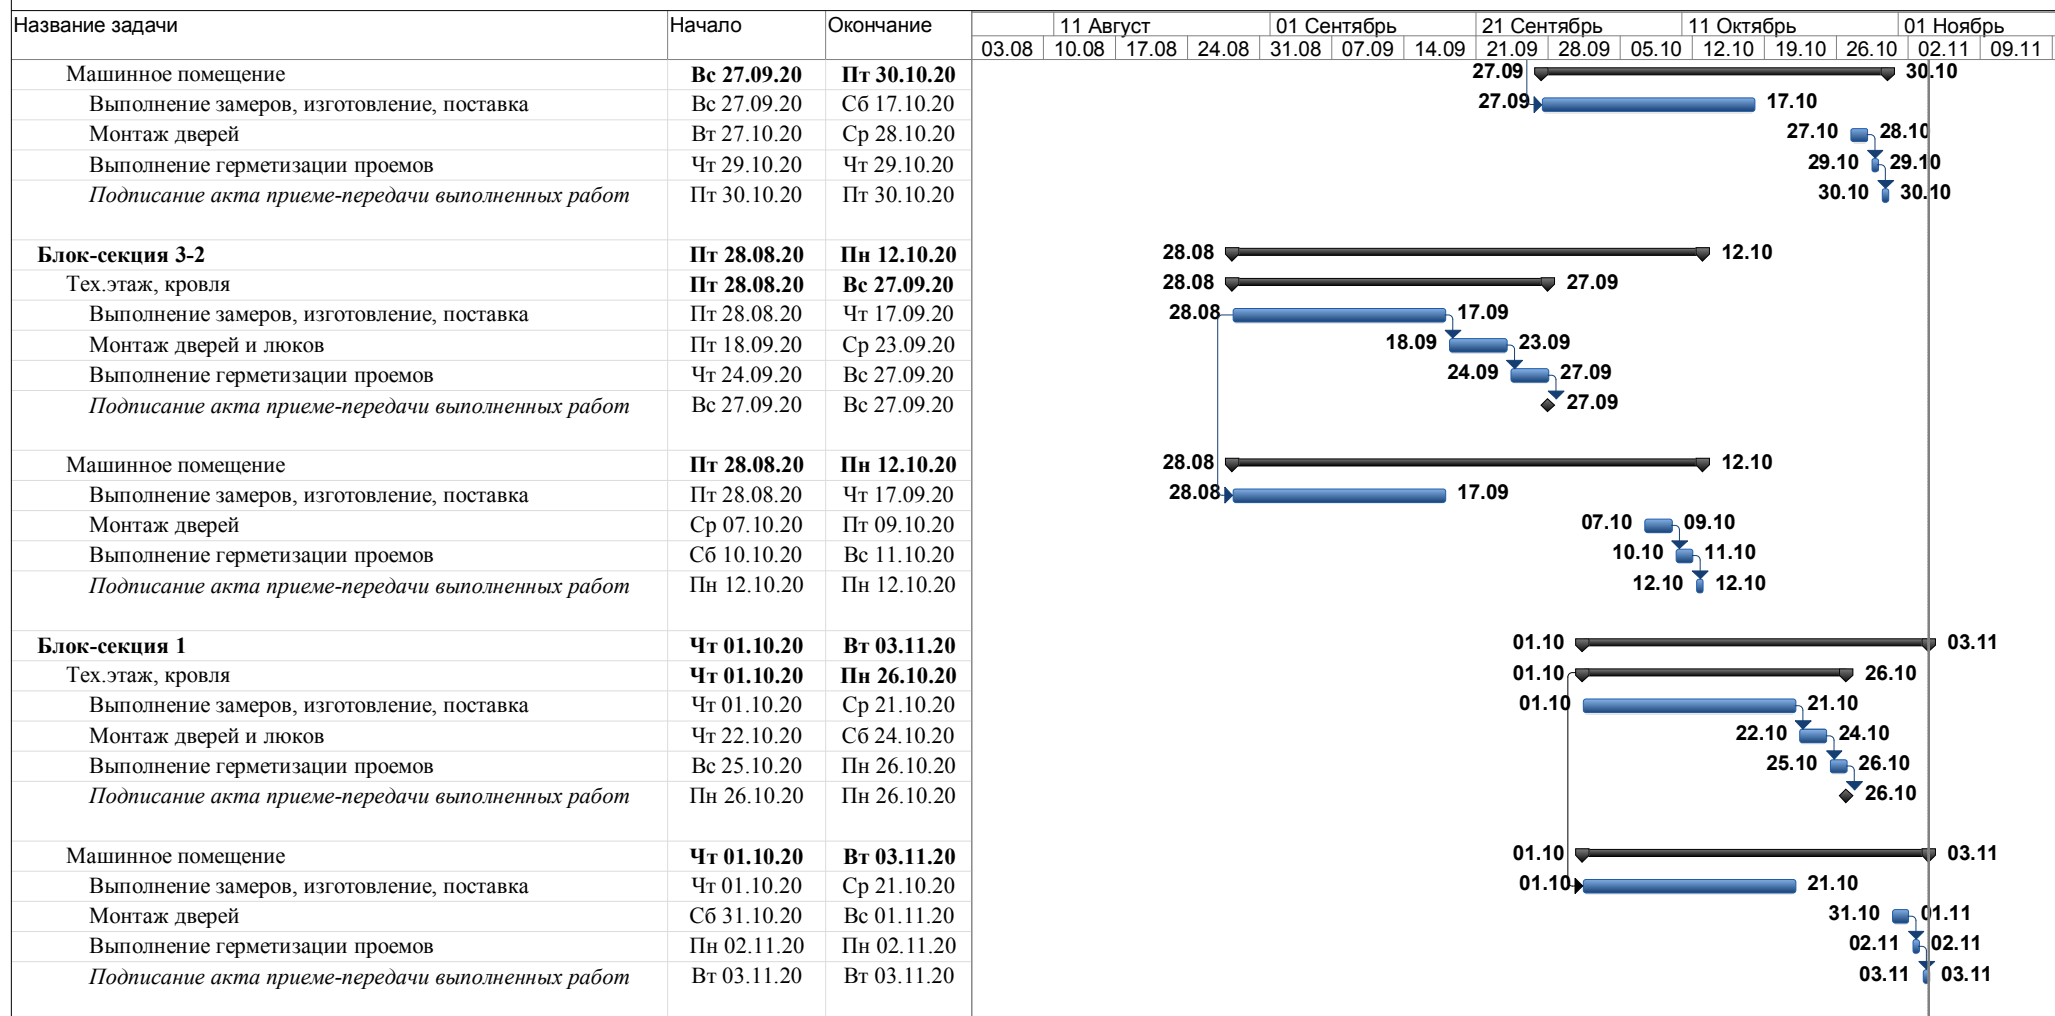

Начальник ПТО
М.А. Запылихин
