График производства работ по устройству внутренних сетей связи на объекте строительства - многоквартирный жилой дом № 20 (по ГП)
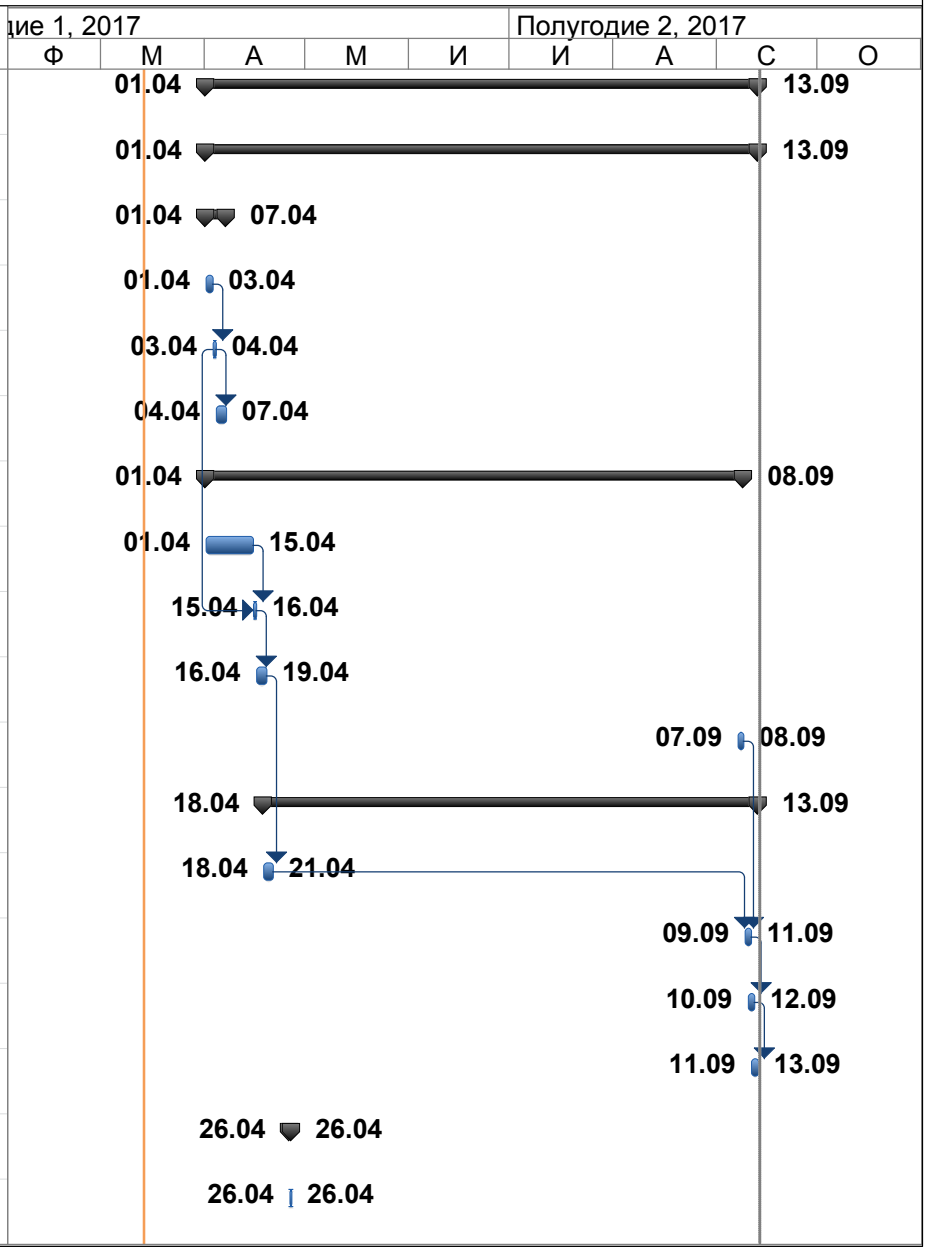
Название задачи	Начало	Окончание
Устройство сетей связи	**Сб 01.04.17**	**Ср 13.09.17**
Блок-секции 1-2	**Сб 01.04.17**	**Ср 13.09.17**
Телевидение	**Сб 01.04.17**	**Пт 07.04.17**
Установка телевизионной антены	Сб 01.04.17	Пн 03.04.17
Прокладка ТВ кабеля по тех.этажу	Пн 03.04.17	Вт 04.04.17
Прокладка ТВ кабеля по стоякам	Вт 04.04.17	Пт 07.04.17
Радиофикация	**Сб 01.04.17**	**Пт 08.09.17**
Прокладка кабеля по квартирам	Сб 01.04.17	Сб 15.04.17
Прокладка ПТПЖ кабеля по тех.этажу	Сб 15.04.17	Вс 16.04.17
Прокладка ПТПЖ кабеля по стоякам	Вс 16.04.17	Ср 19.04.17
Установка радиорозеток	Чт 07.09.17	Пт 08.09.17
Автономная пожарная сигнализация	**Вт 18.04.17**	**Ср 13.09.17**
Установка крепежа для датчиков	Вт 18.04.17	Пт 21.04.17
Установка крышек в МОП	Сб 09.09.17	Пн 11.09.17
Установка крышек НК-1, НК-2	Вс 10.09.17	Вт 12.09.17
Установка датчиков	Пн 11.09.17	Ср 13.09.17
Телефонизация	**Ср 26.04.17**	**Ср 26.04.17**
Прокладка кабеля по тех.подполью	Ср 26.04.17	Ср 26.04.17
